

TITULNÝ LIST PONUKY

„ Kritériá “

Názov zákazky

Výstavba vonkajšieho javiska

Značka oznámenia vo VVO:

2098 – WYP

Vestník č.:

17/2016

Miesto zákazky:

Obec Brestovec

Zoznam dokumentov:

1. Titulný list	1
2. Identifikačné údaje uchádzača	2
3. Zmluva o dielo	3-17
4. Výkaz - výmer	18-29
5. Harmonogram práce	30-31
6. Opis pracovných pozícií	32
7. Návrh na plnenie kritérií	33



Sídlo: Nám. Priateľstva 2169/19, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 32 322 127, DIČ / IČ DPH: SK1020254895

Identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno: Štefan Gavlíder - GAGAKO - STAV

Sídlo/ Adresa: Námestie Priateľstva 2169/19
929 01 Dunajská Streda

Registrácia: Okresný úrad Dunajská Streda
Číslo živnostenského registra 201 - 4339

Právna forma: Fyzická osoba

Zodpovedný zástupca: Štefan Gavlíder

IČO: 32322127

DIČ: 1020254895

IČ DPH: SK1020254895

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0021920834/0900

Mobil: +421 905 603 338

e-mail: gagako@gagako.sk
gagako@centrum.sk

GAVLÍDER Štefan - GAGAKO - STAV
Nám. Priateľstva 2169/19
929 01 DUNAJSKÁ STREDA
IČO: 32 322 127
IČ DPH: SK1020254895

.....
Štefan Gavlíder

ZMLUVA O DIELO

na zhotovenie diela

„Výstavba vonkajšieho javiska„

uzavretá v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

Čl. I

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Názov: Obec Brestovec
Sídlo: Hlavná 86, 94 617
IČO: 00306380
Zastúpený: Peter Tóth
Tel: +421(0)35 77800 83
Fax: +421(0)35 77381 21
Mobil: +421/905 360 000
E-mail: obec@brestovec.eu
Bankové spojenie:
Č. účtu - IBAN:

/ďalej len „objednávateľ“/

1.2. Zhotoviteľ :

Názov: Štefan Gavlíder – GAGAKO – STAV
Sídlo : Námestie Priateľstva 2169/19
Štatutárny orgán: Štefan Gavlíder
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: Štefan Gavlíder
IČO: 32322127
DIČ : 1020254895
IČ DPH : SK1020254895
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu / IBAN: 0021920834/0900
Telefón, fax : +421 905 603 338
E-mail : gagako@gagako.sk
Údaj o zápise v obchodnom alebo inom registri : OÚ Dunajská Streda, ČŽR 201 - 4339

/ďalej len „zhotoviteľ“/

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je výsledok obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet obstarávania „**Výstavba vonkajšieho javiska**“. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – verejnú súťaž – podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska.

ČI. II

PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby „**Výstavba vonkajšieho javiska**“ v súlade s oceneným výkazom výmer zo dňa 09.02.2016 vypracovaným zhotoviteľom na základe súťažných podkladov - časť B. 1 (opis predmetu obstarávania) a prílohy č. 7 (Dokumentácia k stavbe - Výkaz výmer stavby/Rozpočet, posudok, grafické znázornenie okien a dverí). Zhotoviteľom ocenený výkaz výmer tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1.
- 2.2. Uzavretím tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zmluvy.
- 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo uvedené v bode 2.1. tohto článku, ktoré bude zhotovené v rozsahu a v súlade s oceneným výkazom výmer, podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v požadovaných kvalitatívnych podmienkach a v zmysle platných STN i v súlade s požiadavkami objednávateľa a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.5. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela a disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

ČI. III

KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Dielo musí byť zhotovené v súlade s podmienkami uvedenými v čl. II. tejto zmluvy, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.
- 3.2. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od zahájenia po ukončenie diela dokumentmi (napr.):
 - doklady o odovzdaní a preberaní rozhodujúcich dodávok,

- záručné listy, atesty výrobkov, certifikáty,
- doklady o odstránení väd a nedorobkov,
- protokol o vykonaní komplexných skúšok,
- zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

3.3. Zhotoviteľ ručí za skutočnosť, že zabudované materiály a dodávky diela sú prvej akosti a vyhovujú platným normám a predpisom.

IV.

CENA DIELA

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a maximálnej cene diela, ktorá je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, za dohodnutých podmienok vo výške: *(doplní uchádzač)*

Cena bez DPH	84 311,82	EUR
DPH 20 %	16 862,37	EUR

Cena celkom spolu s DPH	101 174,20	EUR
--------------------------------	-------------------	------------

Slovom: stojedentisícstosedemdesiatštyri eur a dvadsať centov

=====

- 4.2. Objednávateľ si vyhradzuje právo pred začatím prác ako aj v priebehu realizácie diela upraviť rozsah vykonaných prác v závislosti od svojich finančných možností.
- 4.3. Zhotoviteľ berie na vedomie a súčasne súhlasí v plnom rozsahu a bez výhrad, že v prípade, ak dôjde k zmene v rozsahu vykonaných prác podľa bodu 4.2 tohto článku, cena diela uvedená v bode 4.1 tohto článku bude upravená v závislosti od príslušnej zmeny rozsahu vykonaných prác a objednávateľ bude povinný zaplatiť cenu diela po vykonanej úprave.
- 4.4. Cena diela, dohodnutá medzi oboma zmluvnými stranami, zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce zhotoviteľa, ktoré budú potrebné či už pri realizácii alebo potrebné k prevzatíu a kolaudácii diela a jeho odovzdaníu do užívania. V cene sú zahrnuté aj náklady na odvoz stavebnej sute, za užívanie verejného priestranstva a náklady na všetky potrebné povolenia k užívaniu verejných plôch, tieto zabezpečuje zhotoviteľ.
- 4.5. Ak zhotoviteľ neocení niektorú položku vo výkaze výmer, alebo zmenil jej množstvo oproti výkazu výmer, má sa za to, že cenový rozdiel je zahrnutý v iných sadzbách a cenách ostatných položiek ponukovej ceny zhotoviteľa a preto nemá nárok na úhradu v prípade, že neocenená

- položka, ako aj zmenené množstvo položky boli použité na vykonanie diela zavinením zhotoviteľa.
- 4.6. Bez písomného súhlasu objednávateľa a projektanta nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály a zariadenia oproti dokumentácii stavebných prác. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovávania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
- 4.7. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch:
- vlastných chýb,
 - nepochopenia zadania,
 - nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela,
 - zvýšenia cien dodávok a prác pre dielo.
- 4.8. Zhotoviteľ nesmie zrealizovať prípadné navyše práce bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa a uzatvoreného dodatku k ZoD na tieto práce navyše. V prípade, ak zhotoviteľ vykoná navyše práce bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, nemá nárok na zaplatenie za takto vykonané práce.

ČI. V

ČAS PLNENIA

- 5.1. Lehota dodania diela: 101 kalendárnych dní od protokolárneho odovzdania staveniska
- 5.2. Dodržiavanie termínu podľa bodu 5.1. zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela dôsledkom čoho je predĺženie času plnenia podľa bodu 5.1. tejto zmluvy.
- 5.4. V prípade prerušenia prác z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu tzv. vyššej moci, zmluvné strany si dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy, pričom predĺženie lehoty plnenia bude primerané dobe, na ktorú treba vykonanie prác prerušiť.
- 5.5. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho ucelenú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 5.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať bezplatne, v termíne do 5 dní od podpísania tejto zmluvy, harmonogram pre realizáciu stavby tak, aby bolo zrejmé realizovanie jednotlivých častí objektu. V priebehu výstavby je možné meniť harmonogram výstavby len so súhlasom objednávateľa.

ČI. VI

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1. Preddavok na realizáciu stavby sa neposkytuje.
- 6.2. Zhotoviteľ má právo vystaviť faktúru až na základe riadneho protokolárneho odovzdania diela. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce. Splatnosť faktúr je 60 dní od doručenia faktúry v prípade, že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky. V prípade, že faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti, objednávateľ ju vráti na doplnenie alebo prepracovanie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.3. Podkladom pre fakturáciu bude technickým dozorom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác. Technický dozor potvrdí súpis až po predložení certifikátov a protokolov o kvalite zabudovaných konštrukcií a materiálov. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť potvrdenie uvedeného súpisu z dôvodu nedodržania akosti a štruktúry deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.4. Zhotoviteľ zostaví súpis, v ktorom práce a dodávky ocení podľa položiek uvedených vo výkaze výmer. Súpis vykonaných prác a dodávok skontroluje a následne sa k tomu vyjadří do 3 pracovných dní poverený zástupca objednávateľa - ako technický dozor objednávateľa. Ak súpis má vady, bude vrátený zhotoviteľovi na prepracovanie. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce a dodávky.
- 6.5. Jednotlivé faktúry vyhotoví zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou - zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a predloží objednávateľovi v 4 originálnych výtlačkoch, ktoré budú obsahovať minimálne: označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ, číslo tejto zmluvy o dielo, číslo zmluvy o poskytnutí dotácie, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú sumu bez DPH, DPH a celkovú sumu s DPH, označenie diela, pečiatka a podpis oprávnenej osoby.
- 6.6. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať 10% z ceny diela (kolaudačnú ratu) do doby odstránenia väd a nedorobkov zistených a spísaných pri odovzdávanom a preberacom konaní.
- 6.7. Objednávateľ si vyhradzuje právo účtovať vo faktúre všetky zmluvné pokuty, ktoré zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok tejto zmluvy.

Čl. VII

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1. Odovzdanie staveniska

- 7.1.1 Objednávateľ protokolárne odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 2 pracovných dní po podpise a účinnosti zmluvy o dielo a zhotoviteľ je povinný v uvedenej lehote stavenisko prevziať. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany v stavebnom denníku.

7.1.2 **Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.**

7.2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa

7.2.1. **Odvzdá pri preberaní staveniska všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie diela, ktorým je oznámenie k ohláseniu stavebných úprav.**

7.2.2. **Odvzdá zhotoviteľovi dve vyhotovenia stavebných výkresov.**

7.2.3. **Prostredníctvom svojich oprávnených osôb zaznamenáva a potvrdzuje preberanie vykonaných prác v stavebnom denníku.**

7.2.4. **Je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.**

7.2.5. **Objednávateľ určí technický dozor s preukázateľnou odbornou kvalifikáciou, ktorý bude kontrolovať realizáciu stavebných prác a odsúhlasovať vykonané práce evidované v stavebnom denníku.**

7.3. Povinnosti zhotoviteľa

7.3.1 **Zástupca zhotoviteľa Karol Bolcskei (uviesť konkrétnu osobu) – stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela a predkladať stavebný denník technickému dozorcovi objednávateľa denne. K zápisom zástupcu objednávateľa sa má vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. Zhotoviteľ určí stavbyvedúceho s preukázateľnou odbornou kvalifikáciou, ktorý bude organizovať, riadiť, koordinovať a zodpovedať za stavebné práce a iné činnosti ako aj zodpovedať za realizované práce a dodávky na stavenisku.**

7.3.2 **Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, jeho pokynmi, zápismi, dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.**

7.3.3 **Zhotoviteľ je v súlade s ust. § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti.**

7.3.4 **Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi.**

- 7.3.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odozdania diela objednávateľovi.
- 7.3.6 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác. Z dôvodu výkonu stavebných prác aj počas prevádzky ZŠ, zhotoviteľ je povinný prijať a vykonať potrebné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti detí a personálu v ZŠ po celú dobu zhotovovania diela.
- 7.3.7 Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu v mieste a počas vykonávania diela a je povinný v priebehu výstavby odstraňovať na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 7.3.8 Zhotoviteľ deklaruje, že všetky prevádzkové stroje budú naplnené ekologicky odbúrteľnými olejmi.
- 7.3.9 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ.
- 7.3.10 Zhotoviteľ berie na vedomie, že zhotovenie diela je závislé od poskytnutia finančných prostriedkov v rámci Programu rozvoja vidieľa 2014-2020, z prostriedkov dotácie Štátneho rozpočtu pre objednávateľa.
- 7.3.11 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o BOZP, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov, Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- 7.3.12 Zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon pracovníkov v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z.

- o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov. Mená pracovníkov oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie jednotlivých činností.
- 7.3.13 Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela. Stavebné zabudované prvky musia byť dodané podľa výkazu výmer – Príloha č. 1 tejto zmluvy a musia byť dodržané všetky požadované parametre prvkov, platných STN, (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych,
- 7.3.14 Všetky materiály použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.
- 7.3.15 Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných prác schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.
- 7.3.16 Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 7.3.17 Zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) revízneho technika na odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa §24 vyhlášky 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Meno technika oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.
- 7.3.18 Odborné skúšky a revízie vyhradených zariadení budú vykonávané revíznymi technikmi Zhotoviteľa v súlade s príslušným technologickým postupom a platnou legislatívou. Náklady na výkony revíznymi technikmi znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný k vykonaniu odborných skúšok a revízií predložiť dokumentáciu v zmysle platných predpisov a požiadaviek revízneho

technika. Súčasťou predkladanej dokumentácie bude vždy realizačný projekt so zakreslenými zmenami a odchýlkami.

- 7.3.19 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v súlade s čl. II. tejto zmluvy.
- 7.3.20 Zhotoviteľ nesmie počas trvania zmluvy svoj záväzok realizácie diela alebo jeho časti previesť na iného bez predchádzajúceho písomného povolenia objednávateľa. Pokiaľ tak urobí, je to vážne porušenie zmluvy, objednávateľ má právo okamžite odstúpiť od zmluvy a zhotoviteľ znáša všetky následky, vrátane náhrady škody, spôsobenej novým subdodávateľom, ku ktorému objednávateľ nedal súhlas. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastáť zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa, ktorá bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastáť zmena subdodávateľa neoznámí zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený.
- 7.3.21 V prípade, ak zhotoviteľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetu tejto zmluvy, je povinný v takomto prípade zamestnať na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetu tejto zmluvy (obec, okres, VÚC).

ČL. VIII

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 8.1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Pripravenosť na odovzдание je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne najmenej 3 dni vopred.
- 8.2. Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi doklady:
- a) osvedčenie o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - b) certifikáty, atesty a záručné listy použitých materiálov,
 - c) zápisy o kontrole činností a častí diela zakrytých v priebehu jeho realizácie,
- V opačnom prípade má dielo vady. Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od zvyšných materiálov, odpadov a nečistôt, ktoré sú výsledkom jeho činnosti tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.

- 8.4. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spiše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd.
- 8.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy z dôvodu nedodržania akosti a štruktúry deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Čl. IX

SANKCIE

- 9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške:
- a) 0,05% z celkovej ceny diela podľa bodu 4.1. tejto zmluvy za každý deň omeškania s plnením svojej povinnosti dodať dielo riadne a včas,
 - b) 0,05% z celkovej ceny diela podľa bodu 4.1. tejto zmluvy za každý deň omeškania, ak nevypratá stavenisko na vlastné náklady v súlade s bodom 8.3. tejto zmluvy,
 - c) 0,05% z celkovej ceny diela podľa bodu 4.1 tejto zmluvy za každý deň omeškania, ak zhotoviteľ ani po písomnej výzve v lehote určenej v predmetnej výzve neodstráni vadu diela,
 - d) 30,- eur za každú závalu a za každý deň omeškania, ak nenastúpil na odstránenie reklamácií v záručnej dobe v lehote do 2 pracovných dní alebo v dojednanej lehote.
- 9.2. V prípade, že počas vykonávania diela objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nedodrжал kvalitatívne parametre určené pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z celkovej ceny diela za každý zistený nedostatok. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo v súlade s touto zmluvou.
- 9.3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb alebo vyúčtovania ceny za dielo, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 9.4. Zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok zmluvných strán na uplatnenie náhrady škody.

Čl. X.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené riadne v súlade s ustanovením čl. II. tejto zmluvy a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.2. Dielo má vady ak:
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 8.2. tejto zmluvy,

- d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
- 10.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použitie písomne trval.
- 10.4. Záručná lehota na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Záručná doba na technologické časti diela, okná, dvere a zasklené steny je podľa záruky, ktorú udáva výrobca.
- 10.5. Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.
- 10.6. Objávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná elektronicky (emailom) a zároveň listovou zásielkou.
- 10.7. Za skryté vady zodpovedá zhotoviteľ počas záručnej doby odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. Skryté vady sú tie, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela a ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote. Tieto vady je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa bezodkladne po ich zistení podľa bodu 10.6 tejto zmluvy.
- 10.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela do 2 pracovných dní od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 10.6. tejto zmluvy a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne.
- 10.9. Havarijný stav zhotoviteľ je povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom.
- 10.10. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v dohodnutej lehote, objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa.
- 10.11. V prípade, ak z dôvodu vady diela vznikne navyš práca na diele, zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi náhradu škody v plnej výške ceny vzniknutej navyš práce.

ČI. XI

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 11.2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.
- 11.3. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku objednávateľa.

ČI. XII**PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY**

- 12.1. Vlastnícke právo k zhotovenému dielu prechádza na objednávateľa protokolárnym odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi a zaplatením dohodnutej ceny.
- 12.2. Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom kedy sa stáva vlastníkom diela.

ČI. XIII**ODSTÚPENIE OD ZMLUVY**

- 13.1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 dní potom, ako sa o jej porušení dozvedela.
- 13.2. Objávateľ môže od zmluvy odstúpiť aj v týchto prípadoch:
- zhotoviteľ do 7 dní od prevzatia staveniska nezačne s realizáciou prác,
 - z dôvodu meškania, ak je vážne ohrozený termín ukončenia predmetu plnenia zmluvy,
 - z dôvodu opustenia staveniska zhotoviteľom na dobu dlhšiu ako 7 dní, nedodržanie kvality prác a materiálov, podvodu, neschopnosti a pod.,
 - ak sa situácia zhotoviteľa zmenila do takej miery, že technické alebo finančné záruky ktoré ponúka, nie sú adekvátne vzhľadom na povahu a dôležitosť prác a dodávok podľa tejto zmluvy,
 - z dôvodu porušenia podmienok a podkladov súťaže zhotoviteľom, do ktorej zhotoviteľ predložil súťažnú ponuku a ktorú objednávateľ prijal,
 - dielo je zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne alebo nezodpovedá požiadavkám stanoveným zmluvou alebo príslušným normám a právnym predpisom,
 - zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej objednávateľom,
 - z dôvodu neposkytnutia finančných prostriedkov na plnenie predmetu zmluvy, čo objednávateľ zhotoviteľovi bezodkladne písomne oznámi,
 - z dôvodu porušenia povinnosti stanovenej v článku VII. odsek 7.3. bod 7.3.3. tejto zmluvy,
 - bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa prevedie práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,
 - zhotoviteľ stratil akékoľvek oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na riadne a včasné zhotovenie diela v súlade s príslušnými právnymi predpismi,

- l) zhotoviteľ si nesplní oznamovaciu povinnosť ohľadne subdodávok podľa bodu 7.3.19 tejto zmluvy,
- m) ak sa ktorékoľvek vyhlásenie alebo ubezpečenie zhotoviteľa uvedené v tejto zmluve ukáže ako nepravdivé alebo nesprávne.
- 13.3. V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy bez zavinenia objednávateľa, objednávateľ je oprávnený fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z dohodnutej ceny diela uvedeného v článku IV. bod 4.1 tejto zmluvy.
- 13.4. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane, ak nie je v odstúpení určená neskoršia účinnosť odstúpenia.
- 13.5. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovedty uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované.
- 13.6. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
- a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy sa stáva vlastníctvom objednávateľa,
 - b) práce realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu,
 - c) práce vykonané do odstúpenia od zmluvy vysporiada zhotoviteľ faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.
- 13.7. V prípade predčasného ukončenia zmluvy zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia protokolárne odovzdať objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovenia diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovedty zhotovených častí diela.
- 13.8. V prípade zániku zmluvy zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní opustí stavenisko, odstráni zariadenie staveniska a stavenisko vyčistí od odpadov a nečistôt, ktoré vznikli jeho činnosťou.

ČI. XIV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


- 14.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR.
- 14.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.
- 14.3. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode oboch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.

- 14.4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pred podpisom tejto zmluvy musí byť zaregistrovaný v Registri konečných užívateľov výhod vedeným Úradom pre verejné obstarávanie. Register konečných užívateľov výhod bol ku dňu 01.11.2015 zriadený v zmysle § 134a zákona o verejnom obstarávaní. (V súvislosti s posledne prijatou novelou č. 252/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon o verejnom obstarávaní, účinnou od 01.11.2015 sa zaviedla povinnosť uzatvárať zmluvy, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania výhradne s uchádzačmi so známou majetkovou štruktúrou. Povinnosť byť zapísaný v registri konečných užívateľov výhod sa vzťahuje na zmluvy, koncesné zmluvy a rámcové dohody týkajúce sa nadlimitných zákaziek a podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska, zákaziek s využitím elektronického trhoviska a to vo verejných obstarávaniach vyhlásených od 01.11.2015.)
- 14.5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
- 14.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 14.7. Účinnosť tejto zmluvy je podmienená poskytnutím finančných prostriedkov v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020 a z prostriedkov Štátneho rozpočtu pre objednávateľa. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (§ 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov). Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 14.8. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním riadne prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia. Ďalej vyhlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.
- 14.9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
- Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer/Rozpočet
- Príloha č. 2: Časový a vecný harmonogram

V Brestovci, dňa 29.9.2016

V dňa

za objednávateľa



GAVLÍDER Štefan - GAGAKO - STAV
Název zhotoviteľa
929 01 DUNAJSKÁ STREDA
IČO 32 322 127
IČ DPH: SK1020254895

Štefan Gavlíder – GAGAKO -
STAV

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Výstavba vonkajšieho javiska
Objednávateľ: Obec Brestovec
Zhotoviteľ: Štefan Gavlíder - GAGAKO-STAV

Dátum: 9. 9. 2016
Projektant:
Spracoval: Štefan Gavlíder

Kód	Základka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
0041	Výstavba vonkajšieho javiska	84.311,83	16.862,37	101.174,20
01	Architektúra a Statika	75.255,94	15.051,19	90.307,13
02	Elektroinštalácia, bleskozvod	2.778,08	555,62	3.333,70
03	Zdarvotechnika	6.277,81	1.255,56	7.533,37

Celkom 84.311,83 16.862,37 101.174,20

GAVLÍDER Štefan - GAGAKO - S
Nám. Priateľstva 2169/19
929 01 DUNAJSKÁ STREDA
IČO: 32 322 127
IČ DPH: SK1020254895

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby:	Miestnosť vonkajšieho javiska	JKSO	
Název objektu:		EČO	
Objektovosť:	Obec Brestovec	Miesto	Brestovec
Projektant:		IČO	DIČ
Zhotoviteľ:	Štefan Gavlíder - GAGAKO-STAV	32 322 127	SK1020254895
Stavovateľ:	Štefan Gavlíder		
Rozpočet číslo		Dňa	09.02.2016

Merné a účelové jednotky

Popis	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	Dodávky	22.604,89	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	18.884,85	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00
3	Dodávky	6.371,61	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	33.672,39	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00
6	Montáž	2.778,08			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	VRN (r. 1-6)	84.311,83	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	DPH	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Datum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	84.311,83
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 84.311,83	16.862,37
Datum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-25)	101.174,20
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty		
Datum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa	0,00
				27	Kízavá doložka	0,00
				28	Zvýhodnenie + -	0,00

GAVLÍDER Štefan - GAGAKO - STAV
 Nám. Priateľstva 2169/19
 929 01 DUNAJSKÁ STREDA
 IČO: 32 322 127
 IČ DPH: SK1020254895

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název: **Rekonštrukcia kontajnerového javiska**
 Miesto: **Rekonštrukcia z Stavika**

JKSO
 EČO
 Miesto: **Brestovec**

Objaviteľ: **Obec Brestovec**
 Vypracoval: **Štefan Gavlíder - GAGAKO-STAV**
 Podpis: **Štefan Gavlíder**

IČO: **32 322 127** DIČ: **SK1020254895**

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Popis	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A. Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
Práca nadčas	22.549,86	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
Bez pevnej podl.	14.755,60	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
Kultúrna pamiatka	5.487,98	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	32.462,50	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
VRN z rozpočtu	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
DN (r. 8-11)	75.255,94	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
Kompl. činnosť	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
					D Celkové náklady		
					23	Súčet 7, 12, 19-22	75.255,94
					24	DPH 20,00 % z 75.255,94	15.051,19
					25	Cena s DPH (r. 23-25)	90.307,13
					E Prípochty a odpočty		
					26	Dodávky zadávateľa	0,00
					27	Kázavá doložka	0,00
					28	Zvýhodnenie +-	0,00

GAVLÍDER Štefan - GAGAKO - STAV
 Nám. Priateľstva 2169/19
 929 01 DUNAJSKÁ STREDA
 IČO: 32 322 127
 IČ DPH: SK1020254895

ROZPOČET

Služba: Výstavba vonkajšieho javiska

Objekt: Architektúra a Statika

Objednávateľ: Obec Brestovec

Zhotoviteľ: Štefan Gavlíder - GAGAKO-STAV

JKSO:

EČO:

Spracoval: Štefan Gavlíder

Dátum: 9. 2. 2016

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV						37.305,451
1 Zemné práce						2.318,749
1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	80,800	1,220	98,576
2	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	52,000	22,959	1.193,868
3	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	132,800	1,319	175,163
4	184004411	Výsadba stromov výšky 1500-3000 mm, do jamky priemeru 400 mm, hĺbky 600 mm	ks	18,000	6,324	113,832
5	0266067400	Smrekovec - <i>Larix decidua</i> , d 125 - 150 cm	ks	8,000	46,095	368,760
6	0266079200	Smrek - <i>Picea omorica</i> , d 100 - 125 cm	ks	10,000	36,855	368,550
2 Zakladanie						6.908,304
7	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku, dosiek zakladový pas	m3	16,000	26,381	422,096
8	271571985	Ležaté rozvody kanalizácie a vodovodu	kpl	1,000	695,689	695,689
9	273321115	Základové dosky z betónu železového tr.C 20/25	m3	15,000	90,351	1.355,265
10	273356021	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m2	20,000	11,203	224,060
11	273356022	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	20,000	3,349	66,980
12	273361411	Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí KARI	t	0,370	1.399,491	517,812
13	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	26,016	108,039	2.810,743
14	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,661	1.233,978	815,659
3 Zvislé a kompletné konštrukcie						7.431,369
15	311231463	Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ 25 Family 2in1	m3	20,000	143,014	2.860,280
16	311271302	Murivo nosné DT s betónovou výplňou hr. 25 cm	m3	16,500	156,862	2.588,223
17	311361825	Výstuž pre murivo nosné s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,450	601,605	270,722
18	317161251	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	2,000	8,296	16,592
19	317161252	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	4,000	9,888	39,552
20	317161254	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm	ks	4,000	15,272	61,088
21	331321315	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	3,000	113,437	340,311
22	331351105	Debnenie hranatých stĺpov prierezu päť a viacuholníka zhotovenie-dielce	m2	19,200	25,677	492,998
23	331351106	Debnenie hranatých stĺpov prierezu päť a viacuholníka odstránenie-dielce	m2	19,200	2,806	53,875
24	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,285	1.376,226	392,224
25	342243106	Priečky z tehál pálených HELUZ 10 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (100x500x238)	m2	16,000	19,719	315,504
4 Vodorovné konštrukcie						2.960,457
26	411321314	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 20/25	m3	6,000	115,233	691,398
27	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie - dielce	m2	28,000	13,781	385,868
28	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	28,000	4,150	116,200

GAVLÍDER Štefan - GAGAKO-STAV
 Nám. Priateľstva 2169/19
 929 01 DUNAJSKÁ STREDA
 IČO: 32 322 127
 IČ DPH: SK1020254895

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
29	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	28,000	7,389	206,892
30	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	28,000	1,982	55,496
31	411362021	Výstužná KARI sieť stropov	t	0,455	1.335,916	607,842
32	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	1,600	118,004	188,806
33	417351115	Debnenie prekladov a vencov - zhotovenie	m2	22,000	7,724	169,928
34	417351116	Debnenie prekladov a vencov - odstránenie	m2	22,000	2,865	63,030
35	417361821	Výstuž prekladov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,360	1.319,435	474,997

5 Komunikácie 4.811,390

36	564651111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	100,000	4,293	429,300
37	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	200,000	5,636	1.127,200
38	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	100,000	14,301	1.430,100
39	K8PP	Dlažba Top zona Antiko 200x100 mm	m2	110,000	16,589	1.824,790

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 9.068,787

40	612465202	Vnútna omietka stien BAUMIT, vápenocementová, strojné nanášanie,	m2	118,000	13,379	1.578,722
41	622464221	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Silikátová omietka (Baumit SilikatTop), škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	135,000	11,419	1.541,565
42	625250153	Zateplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámov s prikotvením, hr. izolantu 50 mm	m2	26,000	32,795	852,670
43	625251030	Zateplenie ostenia doskami NOBASIL FKD systém BAUMIT hr. 30 mm bez omietky	m2	4,000	33,970	135,880
44	625251100	Zateplenie doskami NOBASIL FKD systém BAUMIT hr. 100 mm bez omietky	m2	110,000	41,258	4.538,380
45	631312411	Mazanina z betónu prostého tr.C 8/10 hr.nad 50 do 80 mm	m3	2,000	103,298	206,596
46	631362021	Výstužná KARI sieť v mazanine podláh	t	0,160	1.343,585	214,974

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1.280,978

47	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	40,000	8,707	348,280
48	OBPS	Obrubník Obrubník parkový Premac OBRUBNIK PARKOVY 100x20x5 cm SIVY	ks	44,000	3,425	150,700
49	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 30 m	m2	168,000	1,855	311,640
50	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 30m	m2	168,000	1,152	193,536
51	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	78,000	3,549	276,822

99 Presun hmôt HSV 2.525,417

52	998011031	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z blokov, výšky do 6 m	t	286,914	8,802	2.525,417
----	-----------	---	---	---------	-------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV 37.950,486

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 270,338

53	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vonor. penetračným náterom za studena	m2	25,000	0,181	4,525
54	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,008	1.505,005	12,040
55	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením	m2	28,000	4,816	134,848
56	6283228200	Pásky ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	30,000	3,746	112,380
57	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,638	2,481	6,545

GAVLÍDER Štefan - GAGAN
Nám. Priateľstva 2169/1B
929 01 DUNAJSKÁ STREDA
IČO: 32 322 127
IČ DPH: SK102025489F

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

712 Izolácie striech 1.083,686

58	712361701	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° gumami fóliou položenou voľne	m2	38,000	13,379	508,402
59	2833000150	FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá, doplnky	m2	44,000	10,168	447,392
60	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	76,000	0,445	33,820
61	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	88,000	1,069	94,072

713 Izolácie tepelné 1.285,915

62	713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, položením na strop	m2	88,000	1,102	96,976
63	2837653422	ISOVER EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	88,000	8,217	723,096

min. obj.hm. 19,5 kg/m3

64	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	88,000	1,255	110,440
65	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh - 1x položenie	m2	38,000	0,713	27,094
66	2837653422	ISOVER EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	38,000	8,217	312,246

min. obj.hm. 19,5 kg/m3

67	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	12,699	1,265	16,063
----	-----------	---	---	--------	-------	--------

763 Konštrukcie - drevostavby 549,216

68	763132110	SDK podhľad KNAUF D112 zavesená dvojrstvová kca profil CD dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	24,000	22,884	549,216
----	-----------	---	----	--------	--------	---------

764 Konštrukcie klampiarske 512,455

69	764731115	Oplechovanie múrov Lindab rš 500 mm	m	28,600	17,918	512,455
----	-----------	-------------------------------------	---	--------	--------	---------

766 Konštrukcie stolárske 760,043

70	766662112	Montáž jednokridl. dverového krídla do zárubne	ks	2,000	37,460	74,920
71	6116303830	Dvere vnútorne 60-90, kovanie, zarubna	s	2,000	342,493	684,986
72	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	7,599	0,018	0,137

767 Konštrukcie doplnkové kovové 29.609,760

73	767641222	Montaz a dodávka plastove okna vrátane parapetov 600x750	ks	1,000	80,272	80,272
74	767641224	Montaz a dodávka plastove okna vrátane parapetov 1500x1500	ks	2,000	374,602	749,204
75	767641225	Montaz a dodávka plastove vchodove dverí vrátane parapetov 900x2000	ks	2,000	802,718	1.605,436
76	7676412256	Montaz a dodávka ocefové schody	kpl	3,000	1.980,037	5.940,111
77	7676412257	Montaz a dodávka ocefového konštrukcia Javiska	kpl	1,000	9.161,682	9.161,682
78	7676412258	Montaz a dodávka striech javiska so lexanom. skrutky, ukon. lišty	m2	112,000	48,163	5.394,256
79	76764122996	Montaz a dodávka - lavica na sedenie	ks	40,000	160,544	6.421,760
80	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	293,527	0,876	257,039

771 Podlahy z dlaždíc 2.736,258

81	771575110	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 400x400 mm	m2	74,500	20,871	1.554,890
82	6976380101	Dodávka keramickej dlažby	m2	25,000	14,547	363,675
83	69763801019	Dodávka keramickej dlažby mrazuvzdorné, protišykové - javisko	m2	56,000	14,547	814,632
84	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	27,332	0,112	3,061

781 Dokončovacie práce a obklady 607,137

607,137
GAVLIER Štefan - GAGAKO - S.r.l.
 Nám. Priateľstva 2169/19
 929 01 DUNAJSKÁ STREDA
 IČO: 32 322 127
 IČ DPH: SK1020254895

1	2	3	4	5	6	7
	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
	Montáž obkladov vnútorných hladkých	m2	15,600	18,473	288,179	
	Dodávka keramického obkladu	m2	18,000	17,699	318,582	
	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	6,068	0,062	0,376	
Dokončovacie práce - maľby					535,678	
	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farnal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	143,000	3,746	535,678	

Celkom

75.255,937

GAVLÍDER Štefan - GAGAKO - STAV

Nám. Priateľsiva 2169/19

929 01 DUNAJSKÁ STREDA

IČO: 32 322 127

IČ DPH: SK1020254895

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Výstavba vonkajšieho javiska
Elektroinštalácia, bleskozvod

JKSO
EČO
Miesto Brestovec

Obec Brestovec
Štefan Gavlíder - GAGAKO-STAV
Štefan Gavlíder

IČO
DIČ
32 322 127 SK1020254895

Rozpočet číslo

Dňa
09.02.2016

Merné a účelové jednotky

Množstvo	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00
Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00
Montáž	2.778,08			18 VRN z rozpočtu	0,00
(DPH r. 1-6)	2.778,08	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady	
				23 Súčet 7, 12, 19-22	2.778,08
				24 DPH 20,00 % z 2.778,08	555,62
				25 Cena s DPH (r. 23-25)	3.333,70
				E Prípochty a odpočty	
				26 Dodávky zadávateľa	0,00
				27 Kízavá doložka	0,00
				28 Zvýhodnenie +-	0,00

GAVLÍDER Štefan - GAGAKO-STAV
 Nám. Priateľstva 2169/1V
 929 01 DUNAJSKÁ STREDA
 IČO: 32 322 127
 IČ DPH: SK1020254895

ROZPOČET

Objekt: Výstavba vonkajšieho javiska

Objekt: Elektroinštalácia, bleskozvod

Objekt: Obec Brestovec

Objekt: Štefan Gavlíder - GAGAKO-STAV

JKSO:

EČO:

Spracoval: Štefan Gavlíder

Dátum: 9. 2. 2016

Číslo pozície	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
2	3	4	5	6	7
Elektromontáž					2.778,083
Elektroinštalácia					1.925,965
0101	CYKY-J 5x6	m	53,000	3,725	197,425
0102	Výstražná fólia	m	47,000	0,327	15,369
0103	Chránič FXKVR 63	m	5,000	1,646	8,230
0104	Dozbrojenie RHK - Ištič 25/3/B	ks	1,000	31,175	31,175
0105	Rozvádzač RH-J	ks	1,000	413,817	413,817
0106	CYKY-J 5x2,5	m	26,000	2,008	52,208
0107	CYKY-J 3x2,5	m	96,000	1,389	133,344
0108	CYKY-J 3x1,5	m	159,000	1,179	187,461
0109	Krabica KPR 68	ks	8,000	3,281	26,248
0110	Krabica KP 68	ks	16,000	0,666	10,656
0111	Zásuvka dvojitá zapustená	ks	8,000	7,239	57,912
0112	Zásuvka nástenná 16A/230V, IP44	ks	6,000	7,006	42,036
0113	Zásuvka nástenná 1653/400V, IP44	ks	1,000	12,388	12,388
0114	Vypínač č.1, IP20	ks	2,000	5,745	11,490
0115	Vypínač č.6, IP20	ks	2,000	6,001	12,002
0116	Trubka FXP20	m	96,000	0,771	74,016
0117	Búracie, sekacie práce	ks	1,000	281,389	281,389
0118	Dokončovacie práce na rozvádzače	ks	1,000	105,083	105,083
0119	Prvá odborná prehliadka	ks	1,000	89,904	89,904
0120	Vyskúšanie, uvedenie do prevádzky	ks	1,000	89,904	89,904
0121	Podr. materiál	%	3,000	12,376	37,129
0122	PPV	%	6,000	6,130	36,779
Bleskozvod					852,118
0201	KO 125	ks	4,000	4,052	16,208
0202	FXP 32	m	20,000	1,786	35,720
0203	SZ	ks	4,000	2,814	11,256
0204	SS	ks	12,000	2,090	25,080
0205	SK	ks	1,000	2,288	2,288
0206	SJ 01	ks	1,000	3,141	3,141
0207	JP 15	ks	2,000	16,965	33,930
0208	FeZn 8mm	m	72,000	3,374	242,928
0209	PV 21	ks	171,000	1,693	289,503
0210	Očísľovanie zvodu 1-4	ks	52,000	0,817	42,484
0211	Odborná prehliadka bleskozvodu	ks	1,000	113,256	113,256
0212	Podr. materiál	%	3,000	4,168	12,505
0213	PPV	%	6,000	3,970	23,819

Celkom

2.778,083

GAVLÍDER Štefan - GAGAKO
 Nám. Priateľstva 2169/15
 929 01 DUNAJSKÁ STREDA
 IČO: 32 322 127
 IČ DPH: SK102025489F

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výstavba vonkajšieho javiska
Název objektu	Zdarvotechnika
Operatívateľ	Obec Brestovec
Projektant	
Zhotoviteľ	Štefan Gavlíder - GAGAKO-STAV
Spracoval	Štefan Gavlíder

JKSO	
EČO	
Miesto	Brestovec
IČO	DIČ
32 322 127	SK1020254895

Rozpočet číslo

Dňa

09.02.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	Dodávky	55,04	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2	Montáž	4.129,26	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava
3	Dodávky	883,63	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažnené podmienky
4	Montáž	1.209,88	11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu
7	VRN (r. 1-6)	6.277,81	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
8	DPH-ZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady
Projektant			Pečiatka		D Celkové náklady		
Datum a podpis					23	Súčet 7, 12, 19-22	6.277,81
Objednávateľ			Pečiatka		24	DPH 20,00 % z 6.277,81	1.255,56
Datum a podpis					25 Cena s DPH (r. 23-25)		7.533,37
Zhotoviteľ			Pečiatka		E Prípochy a odpočty		
Datum a podpis					26	Dodávky zadávateľa	0,00
					27	Kízavá doložka	0,00
					28	Zvýhodnenie +-	0,00

GAVLÍDER Štefan - GAGAKO-STAV
 Nám. Priateľstva 2169/33
 929 01 DUNAJSKÁ STREDA
 IČO: 32 322 127
 IČ DPH: SK1020254895



ROZPOČET

Návrh: Výstavba vonkajšieho javiska

Objekt: Zdarvotechnika

Objektovateľ: Obec Brestovec

Objektovateľ: Štefan Gavlíder - GAGAKO-STAV

JKSO:

EČO:

Spracoval: Štefan Gavlíder

Dátum: 9. 2. 2016

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV				4.184,295
1	Zemné práce				4.145,084
132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	12,400	6,515	80,786
132201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	8,000	1,666	13,328
174201102	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jām, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	4,400	1,320	5,808
174209989	Strkopiesok absyp 0-16	m3	1,000	31,574	31,574
	Montáž a dodávka bet. izolované žumpu	kpl	1,000	4.013,588	4.013,588
4	Vodorovné konštrukcie				39,211
451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku 0-4 mm	m3	1,300	30,162	39,211
PSV	Práce a dodávky PSV				2.093,512
713	Izolácie tepelné				59,489
713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnút.priemer do 38	m	22,700	2,149	48,782
71377102	Tubolit 22x9 na izoláciu potrubia	M	22,700	0,439	9,965
713713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,587	1,265	0,742
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				460,606
721171106	Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 50 x1, 8	m	9,000	12,720	114,480
721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 110x2, 2	m	7,000	14,463	101,241
721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 160x3, 9	m	8,000	22,459	179,672
72117150811	Čistiaci kus D110 s uzatváracím viečkom	ks	1,000	20,336	20,336
7211945557	Montáž vetracie hlavice	ks	1,000	2,248	2,248
7211945557	Vetracia hlavica HL810 DN100, 125	ks	1,000	22,134	22,134
721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	M	24,000	0,669	16,056
721290111	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	4,562	0,973	4,439
722	Zdarvotechnika - vnútorný vodovod				392,904
722171111	Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 16x2 mm v kotúčoch	m	14,200	14,265	202,563
722171113	Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 20x2 mm v kotúčoch	m	8,500	16,221	137,879
722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	22,700	1,307	29,669
722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	22,700	0,887	20,135
722290234	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	3,902	0,681	2,658
725	Zdarvotechnika - zariad. predmety				1.180,513
725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	SU B	1,000	31,574	31,574
7252136050	Sanitárna keramika LYRA NEW WC kombi 2423.6 zadný rovný	ks	1,000	138,927	138,927
72521360501	Sedatko	ks	1,000	28,898	28,898
725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	SU B	1,000	24,082	24,082


GAVLÍDER Štefan - GAGAKO-STAV
 Nám. Priateľstva 2169/11
 929 01 DUNAJSKÁ STREDA
 IČO: 32 322 127
 IČ DPH: SK1020254895

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
2	3	4	5	6	7
7258136330	Sanitárna keramika umývadlo 40 cm biele	ks	1,000	34,429	34,429
725819101	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou	SU B	1,000	9,204	9,204
	Drez z nerez jednoduchý zapustený	KU S	1,000	101,678	101,678
725819301	Montáž ventilu stojankového G 1/2	SU B	1,000	1,927	1,927
7258400670	Ventil výtokový stojankový	s	1,000	4,816	4,816
725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	SU B	3,000	5,887	17,661
7258410400	Ventil rohový dn 15	s	3,000	4,174	12,522
725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	KU S	1,000	7,064	7,064
72581435680	Batéria drezová nástenná štandardná kvalita	s	1,000	80,272	80,272
725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	KU S	1,000	6,422	6,422
72581442860	Batéria umyvadlová stojanková štandardná kvalita	s	1,000	69,569	69,569
725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umyvadlová do D 40	KU S	1,000	2,462	2,462
72581613100	Uzávierka záp. umyv. T 7105 s vent. D 40mm z PH	s	1,000	4,602	4,602
725869204	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová jednodielna D 50	KU S	1,000	3,746	3,746
72581617030	Uzávierka zápachová T 1023 D 50 mm	s	1,000	8,348	8,348
725989101	Montáž dvierok plastových	KU S	1,000	0,428	0,428
72581675750	Dvierka krycie 30x30 cm komaxit biely	s	1,000	10,489	10,489
7259899985	Montáž a dodávka kuch. linka	kpl	1,000	577,957	577,957
72598725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	11,771	0,292	3,436


Celkom

6.277,807

GAVLÍDER Štefan - GAGAKO
 Nám. Priateľstva 2169/19
 929 01 DUNAJSKÁ STREDA
 IČO: 32 322 127
 IČ DPH: SK1020254895

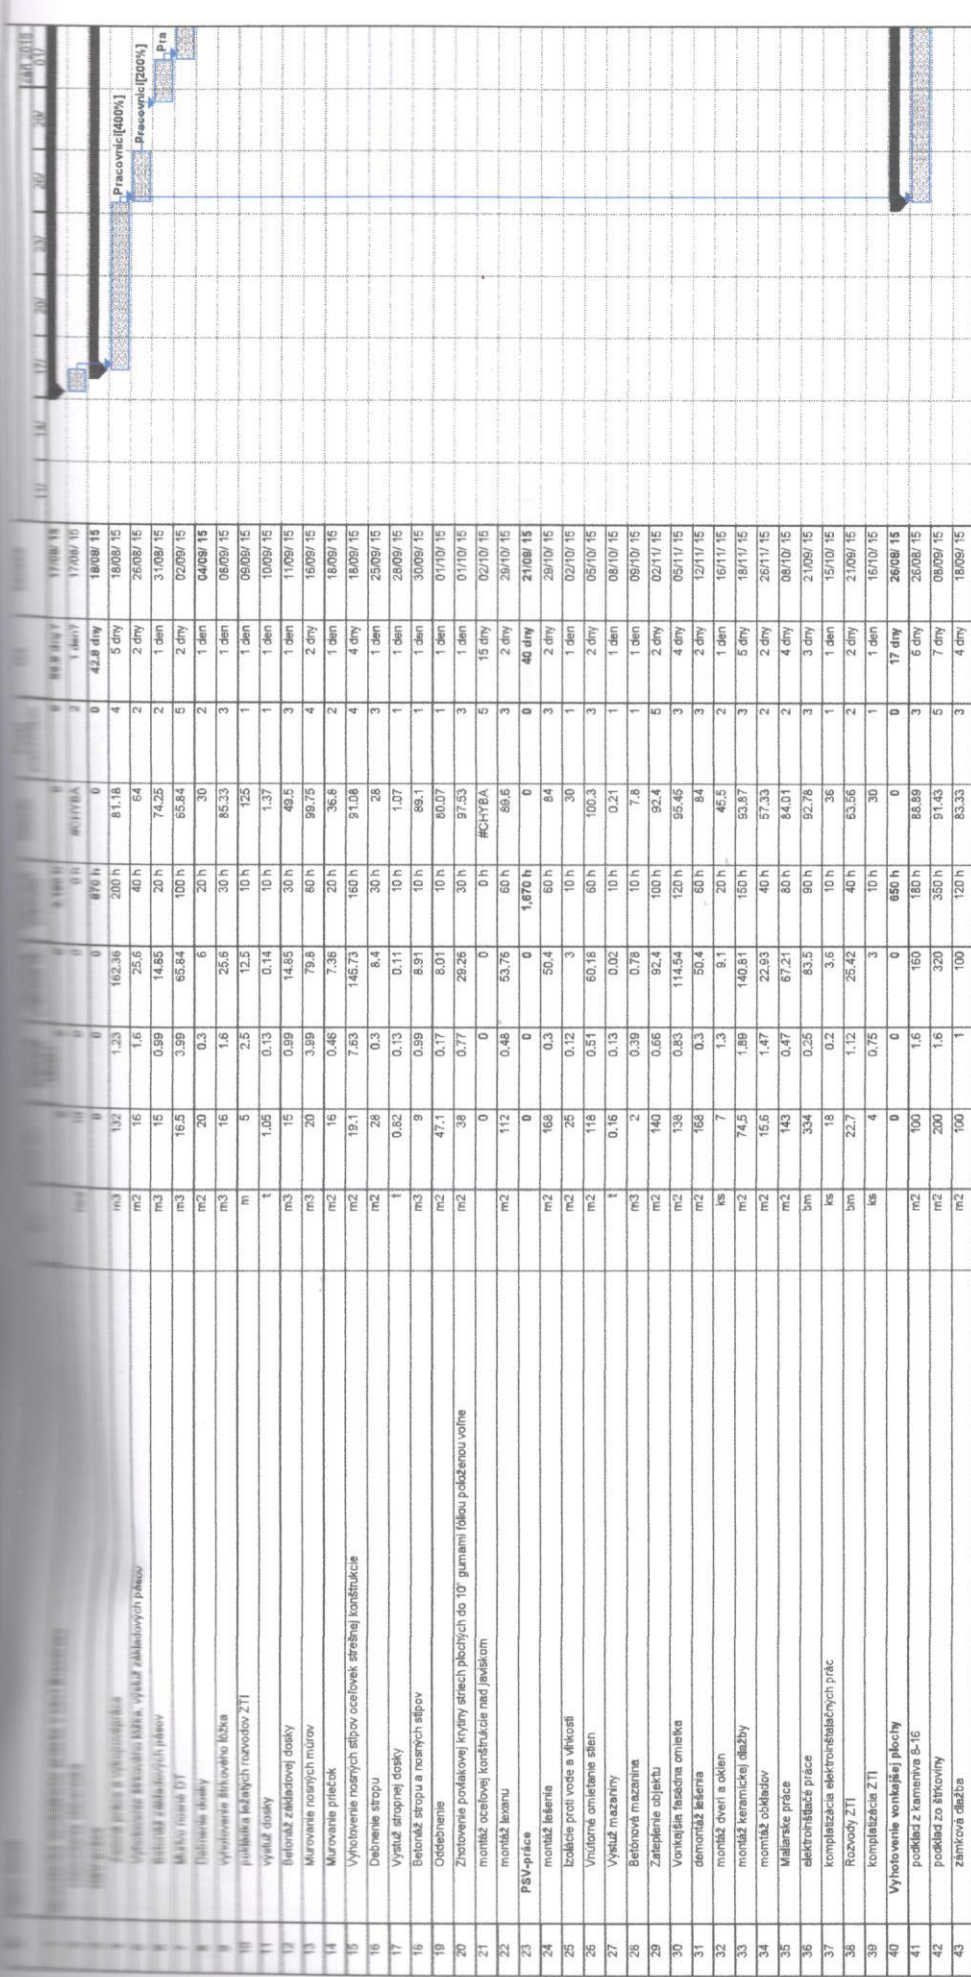

Číslo	Popis práce	Množství	Jednotka	Pracovníci (400%)	Pracovníci (200%)	Pracovníci (100%)	Pracovníci (50%)	Pracovníci (25%)	Pracovníci (12.5%)	Pracovníci (6.25%)	Pracovníci (3.125%)	Pracovníci (1.5625%)	Pracovníci (0.78125%)	Pracovníci (0.390625%)	Pracovníci (0.1953125%)	Pracovníci (0.09765625%)	Pracovníci (0.048828125%)	Pracovníci (0.0244140625%)	Pracovníci (0.01220703125%)	Pracovníci (0.006103515625%)	Pracovníci (0.0030517578125%)	Pracovníci (0.00152587890625%)	Pracovníci (0.000762939453125%)	Pracovníci (0.0003814697265625%)	Pracovníci (0.00019073486328125%)	Pracovníci (0.000095367431640625%)	Pracovníci (0.0000476837158203125%)	Pracovníci (0.00002384185791015625%)	Pracovníci (0.000011920928955078125%)	Pracovníci (0.0000059604644775390625%)	Pracovníci (0.00000298023223876953125%)	Pracovníci (0.000001490116119384765625%)	Pracovníci (0.0000007450580596923828125%)	Pracovníci (0.00000037252902984619140625%)	Pracovníci (0.000000186264514923095703125%)	Pracovníci (0.0000000931322574615478515625%)	Pracovníci (0.000000046566128730773928125%)	Pracovníci (0.0000000232830643653869640625%)	Pracovníci (0.00000001164153218269348203125%)	Pracovníci (0.000000005820766091346741015625%)	Pracovníci (0.0000000029103830456733705078125%)	Pracovníci (0.00000000145519152283668525390625%)	Pracovníci (0.000000000727595761418342626953125%)	Pracovníci (0.0000000003637978807091713134765625%)	Pracovníci (0.00000000018189894035458565673828125%)	Pracovníci (0.000000000090949470177292828369140625%)	Pracovníci (0.00000000004547473508864641415478515625%)	Pracovníci (0.0000000000227373675443232070773928125%)	Pracovníci (0.00000000001136868377216160353869640625%)	Pracovníci (0.0000000000056843418860801769342626953125%)	Pracovníci (0.0000000000028421709430400884671828125%)	Pracovníci (0.000000000001421085471520044233595703125%)	Pracovníci (0.0000000000007105427357600221167978515625%)	Pracovníci (0.0000000000003552713678800110598928125%)	Pracovníci (0.00000000000017763568394000552994640625%)	Pracovníci (0.000000000000088817841970002764973203125%)	Pracovníci (0.0000000000000444089209850013824866015625%)	Pracovníci (0.00000000000002220446049250006924330078125%)	Pracovníci (0.000000000000011102230246250034621650390625%)	Pracovníci (0.0000000000000055511151231250017310751953125%)	Pracovníci (0.00000000000000277555756156250008653759765625%)	Pracovníci (0.000000000000001387778780781250043268788828125%)	Pracovníci (0.00000000000000069388939039062500216444444140625%)	Pracovníci (0.000000000000000346944695195312500108222220703125%)	Pracovníci (0.00000000000000017347234759765625000541111103515625%)	Pracovníci (0.000000000000000086736173798828125000270555550178125%)	Pracovníci (0.000000000000000043368086899414062500013527777500890625%)	Pracovníci (0.000000000000000021684043449707031250000676388875004453125%)	Pracovníci (0.000000000000000010842021724853515625000033819443750022265625%)	Pracovníci (0.000000000000000005421010862426757812500001690972187500111328125%)	Pracovníci (0.000000000000000002710505431213388906250000084548609375000556640625%)	Pracovníci (0.00000000000000000135525271560669453125000004227430468750002783203125%)	Pracovníci (0.0000000000000000006776263578033472656250000021137173437500013916015625%)	Pracovníci (0.0000000000000000003388131789016736328125000001056858671875000069580078125%)	Pracovníci (0.00000000000000000016940658945083681640625000005284293388750000347900390625%)	Pracovníci (0.0000000000000000000847032947254184031250000026421466937500001739501953125%)	Pracovníci (0.00000000000000000004235164736220202015625000001321073346875000008697509765625%)	Pracovníci (0.00000000000000000002117582368110101078125000000660536718750000043487548828125%)	Pracovníci (0.0000000000000000000105879118405505053906250000033026835937500000217437744140625%)	Pracovníci (0.0000000000000000000052939559202752523906250000016513417968750000010871887203125%)	Pracovníci (0.00000000000000000000264697796013762619531250000008256708937500000054359436015625%)	Pracovníci (0.0000000000000000000013234889800688131078125000000412835446875000000271797180078125%)	Pracovníci (0.00000000000000000000066174449003440640390625000020641772343750000013589859015625%)	Pracovníci (0.0000000000000000000003308722450017203201953125000010320886187500000067949295078125%)	Pracovníci (0.00000000000000000000016543612250008601600976562500005160444375000000339746475390625%)	Pracovníci (0.000000000000000000000082718061250004300800488281250000258022218750000001698732376953125%)	Pracovníci (0.0000000000000000000000413590306250002150400244140625000012901110937500000084936618828125%)	Pracovníci (0.000000000000000000000020679515312500010752001220703125000064505559375000004246830915625%)	Pracovníci (0.000000000000000000000010339757656250005376000610351562500003225277968750000212341546875000013589859015625%)	Pracovníci (0.00000000000000000000000516987882812500026880003051781250000161263898437500001061707968750000067949295078125%)	Pracovníci (0.00000000000000000000000258493941406250001344000152578125000008063194687500005308539765625%)	Pracovníci (0.000000000000000000000001292469707031250000672000076289062500004031597343750000265426987500001698732376953125%)	Pracovníci (0.0000000000000000000000006462348531250000336000038144531250000201598671875000013271348828125%)	Pracovníci (0.000000000000000000000000323117426562500016800001907226562500001007993437500000663574687500004246830915625%)	Pracovníci (0.000000000000000000000000161558713281250000840000095363281250000503996718750000265426987500001698732376953125%)	Pracovníci (0.000000000000000000000000080779356406250004200000476816406250000251998359375000013271348828125%)	Pracovníci (0.00000000000000000000000004038967820312500021000002384078125000012599917968750000663574687500004246830915625%)	Pracovníci (0.00000000000000000000000002019483910156250001050000119203906250000629995893750000331795937500001698732376953125%)	Pracovníci (0.000000000000000000000000010097419550781250005250000059601953125000031499796875000016599929375000084936618828125%)	Pracovníci (0.00000000000000000000000000504870977539062500026250000298009765625000157498937500008299964687500004246830915625%)	Pracovníci (0.00000000000000000000000000252435488281250001312500001490048828125000078749468750000414998234375000021234154687500001698732376953125%)	Pracovníci (0.000000000000000000000000001262177441406250006562500007450244140625000393747343750000207499618750000106170796875000067949295078125%)	Pracovníci (0.0000000000000000000000000006310887203125000328125000037251220703125000196874687500010369980937500005308539765625%)	Pracovníci (0.0000000000000000000000000003155443601562500016406250000186261035156250009843734375000026542698750000265426987500001698732376953125%)	Pracovníci (0.0000000000000000000000000001577721800781250008203125000009313051781250004921867187500013271348828125%)	Pracovníci (0.0000000000000000000000000000788860937500041015625000046565289062500024609335937500016599929375000084936618828125%)	Pracovníci (0.0000000000000000000000000000394430468750002050781250000232826468750001230468750000663574687500004246830915625%)	Pracovníci (0.0000000000000000000000000000197215234375000102539062500011641328125000616731875000331795937500005308539765625%)	Pracovníci (0.0000000000000000000000000000098607618750005126953125000058206640625000308365937500016599929375000084936618828125%)	Pracovníci (0.0000000000000000000000000000049303809375000256347656250002910332031250001541829375000829996468750004246830915625%)	Pracovníci (0.0000000000000000000000000000024651904687500012817382812500014551664062500077091468750004149982343750002123415468750001698732376953125%)	Pracovníci (0.00000000000000000000000000000123259523437500064086914062500072758320312500038545793750002074996187500010617079687500067949295078125%)	Pracovníci (0.000000000000000000000000000000616297618750003204345312500036374160312500019272893750001036998093750005308539765625%)	Pracovníci (0.000000000000000000000000000000308148809375000160217265625000181870781250009636446875000517999046875000265426987500026542698750001698732376953125%)	Pracovníci (0.0000000000000000000000000000001540744046875000801086328125000909353906250004819339375000265426987500026542698750001698732376953125%)	Pracovníci (0.00000000000000000000000000000007703720234375000400543125000454766953125000240966937500013271348828125%)	Pracovníci (0.00000000000000000000000000000003851860117187500020227156250002273834375000661934687500066357468750004246830915625%)	Pracovníci (0.00000000000000000000000000000001925930088281250001011382812500011369168750003309673437500033179593750005308539765625%)	Pracovníci (0.0000000000000000000000000000000096296504414062500050569140625000568458437500016599929375000084936618828125%)	Pracovníci (0.00000000000000000000000000000000481482522070312500025284570312500028422921875000829996468750004246830915625%)	Pracovníci (0.000000000000000000000000000000002407412610351562500012642285156250001421146031250004149982343750002123415468750001698732376953125%)	Pracovníci (0.0000000000000000000000000000000012037063051781250006321142656250007105730156250002074996187500010617079687500067949295078125%)	Pracovníci (0.0000000000000000000000000000000006018531528906250003160571328125000355286531250001036998093750005308539765625%)	Pracovníci (0.000000000000000000000000000000000300926576406250001580285640625000177643265625000517999046875000265426987500026542698750001698732376953125%)	Pracovníci (0.0000000000000000000000000000000001504632882031250007901428203125000888216328125000265426987500026542698750001698732376953125%)	Pracovníci (0.00000000000000000000000000000000007523164410156250003950714140625000444108164062500013271348828125%)	Pracovníci (0.0000000000000000000000000000000000376158220703125000197535703125000222054078125000661934687500066357468750004246830915625%)	Pracovníci (0.00000000000000000000000000000000001880791103515625000987673515625000111027031250003309673437500033179593750005308539765625%)	Pracovníci (0.00000000000000000000000000000000000940395551781250004938367578125000555135156250001541829375000829996468750004246830915625%)	Pracovníci (0.000000000000000000000000000000000004701977764062500024691838203125000277567578125000265426987500026542698750001698732376953125%)	Pracovníci (0.0000000000000000000000000000000000023509888820312500012345893750001387837812500013271348828125%)	Pracovníci (0.00000000000000000000000000000000000117549444101562500061729468750006939187500066357468750004246830915625%)	Pracovníci (0.0000000000000000000000000000000000005877472207031250003086473437500034695937500033179593750005308539765625%)	Pracovníci (0.0000000000000000000000000000000000002938736103515625000154323671875000173479687500016599929375000084936618828125%)	Pracovníci (0.000000000000000000000000000000000000146936805178125000771618382031250008673984375000265426987500026542698750001698732376953125%)	Pracovníci (0.0000000000000000000000000000000000000734684028906250003858091406250004336992187500013271348828125%)	Pracovníci (0.00000000000000000000000000000000000003673420144531250001929045703125000216849687500066357468750004246830915625%)	Pracovníci (0.000000000000000000000000000000000000018367100726562500096452285156250001084248437500033179593750005308539765625%)	Pracovníci (0.000000000000000000000000000000000000009183550363281250004822614265625000542124187500016599929375000084936618828125%)	Pracovníci (0.0000000000000000000000000000000000000045917751816406250002411307132812500027106209375000265426987500026542698750001698732376953125%)	Pracovníci (0.0000000000000000000000000000000000000022958875907812500012056535937500013553104687500013271348828125%)	Pracovníci (0.00000000000000000000000000000000000000114794379539062500060282679687500067765523437500066357468750004246830915625%)	Pracovníci (0.00000000000000000000000000000000000000057397189769531250003014133968750003388276187500033179593750005308539765625%)	Pracovníci (0.0000000000000000000000000000000000000002869859488281250001507066984375000169413820312500016599929375000084936618828125%)	Pracovníci (0.00000000000000000000000000000000000000014349297441406250007535334937500084706914062500013271348828125%)	Pracovníci (0.0071746487203125000376766746875000423534570312500066357468750004246830915625%)	Pracovníci (0.003587324361035156250001883833718750002117673437500033179593750005308539765625%)	Pracovníci (0.001793662180517812500094191687500010588367187500016599929375000084936618828125%)	Pracovníci (0.000896831090289062500047095843750005294183820312500013271348828125%)	Pracovníci (0.000448415
-------	-------------	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	--------------------	--------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--	---	--	--	---	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	---	--	--	---	--	---	--	---	--	--	--	---	--	---	---	---	---	---	--	--	--	--	---	---	--	---	---	---	---	--	---	---	--	---	---	--	---	--	---	---	--	--	--	--	---	---	--	--	---	---	--	--	--	---	---	--	--	---	---	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	---	---	--	---	--	--	--	--	---

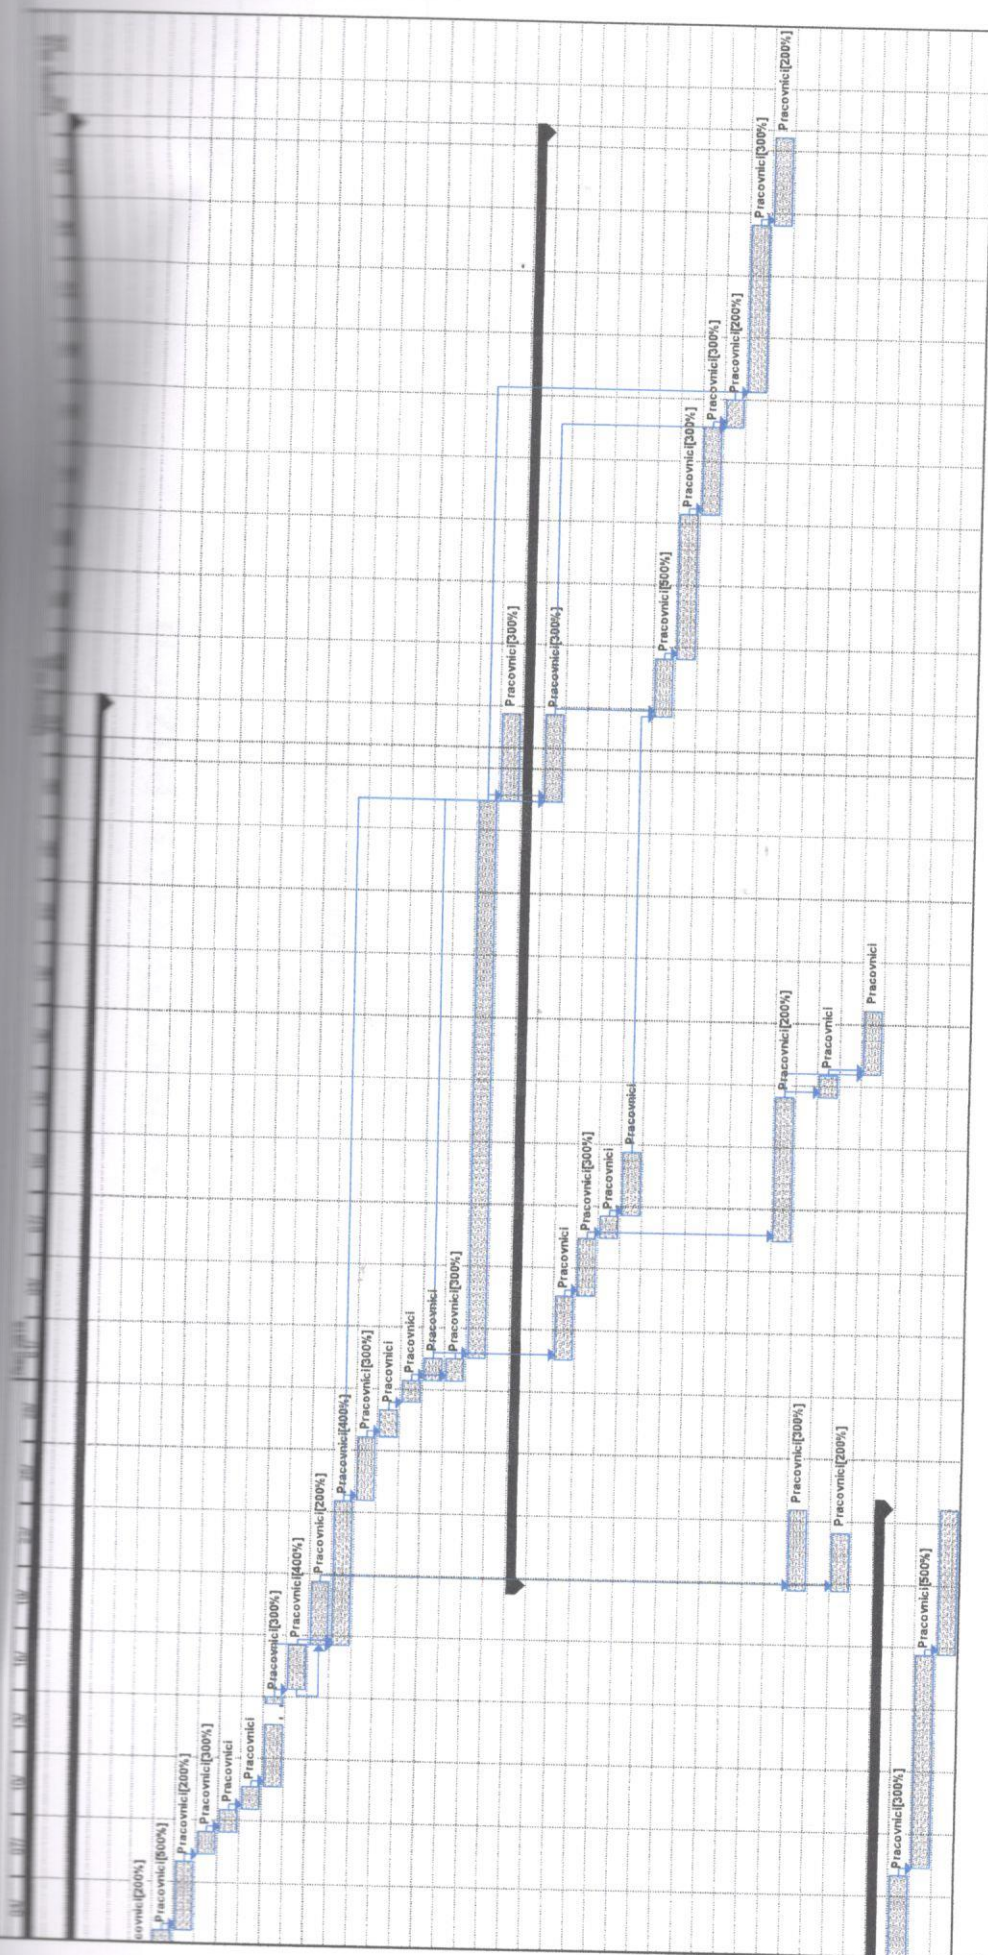

Úkol
Rozdělení

Průběh
Mířik

Souhrnný
Souhrn projektu

Vnější úkony
Vnější mířik

Konečný termín

Projekt: Technická vybavenost pre
Datum: 11/02/16
Projekt: Novostavba volebního javišťa v Oľci Brestovec
Datum: 7.2.2016
Vypracoval: GAGAKO-STAV

GAVLÍDER Štefan - GAGAKO - STAV
Nám. Priateľstva 2169/19
929 01 DUNAJSKÁ STREDA
IČO: 32 322 127
IČ DPH: SK1020264895



Firma:
Štefan Gavlíder - GAGAKO - STAV
Námestie Priateľstva 2169/19
929 01 Dunajská Streda
IČO: 32322127
E-mail: gagako@centrum.sk
Štefan Gavlíder
Mobil: 0905 603 338

OPIS PRACOVNÝCH POZÍCIÍ

Pracovná pozícia	Počet osôb	Opis pracovných pozícií
Revízný technik	1	<ul style="list-style-type: none"> • Vykonávanie odborných prehládok a odborných skúšok elektrických zariadení podľa osvedčenia od Inšpekcie práce. • Vypracovávanie písomných správ o vykonanej revízií.
Stavbyvedúci	1	<p>(Stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a vedie o nich evidenciu v stavebnom denníku.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stavbyvedúci je oprávnený určovať začatie a skončenie jednotlivých stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, dávať pokyny týkajúce sa vykonávania stavebných prác, organizácie práce a pohybu osôb na stavenisku a na stavbe, preberať stavebné výrobky, zisťovať ich vhodnosť a určovať ich umiestnenie a uskladnenie na stavenisku, dávať príkazy na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, ak sa vyskytla prekážka, pre ktorú je ich ďalšie vykonávanie neprípustné, koordinovať poradiť stavebných prác, vykázať cudziu osobu zo staveniska a zo stavby.)
Koordinátor bezpečnosti práce	1	<ul style="list-style-type: none"> • návštevu stavieb, sledovanie postupov a organizácie prác na stavenisku • sledovanie možných rizík vyplývajúcich zo vzájomného ohrozenia a následných prác jednotlivých pracovných skupín • kontrolu dodržiavanie opatrení uvedených v pláne BOZP, dodržiavanie bezpečných postupov, opatrení predpísaných v realizačnej dokumentácii, technologických postupoch, pravidlách spoločného užívania priestorov a zariadení a ďalších zásad určených pre zaisťovanie BOZP na stavbe, zo strany osôb podieľajúcich sa na realizácii stavby • podávanie návrhov objednávateľovi na preventívne technické a organizačné riešenia týkajúce sa bezpečnosti na stavenisku (vrátane návrhov na úpravu a doplnenia plánu BOZP) • spoluprácu a konzultácie so zodpovednými osobami • informovanie o zistených nedostatkoch alebo porušeníach na úseku BOZP a rizikách • účasť na poradách, pri šetrení nežiaducich udalostí na stavbe • spracovanie zápisov o činnosti koordinátora bezpečnosti a popisu stavu bezpečnosti na prísušnej stavbe • ďalšie činnosti v súlade s požiadavkami NV SR č. 396/2006 Z.z. a osobitnými požiadavkami pre príslušnú stavbu)
Ostatní robotníci	-	

V Prešove, dňa: 4.1.2015

Štefan Gavlíder

GAVLIDER Štefan - GAGAKO - STAV

Nám. Priateľstva 2169/19

..... 929 01 DUNAJSKÁ STREDA

meno a podpis: ~~Štefan Gavlíder~~

IC DPH: SK1020250055

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

Kritérium č.1	Cena v EUR bez DPH	DPH	Hodnota kritéria Cena v EUR s DPH
cena uskutočnenia predmetu zákazky	84 311,83	16 862,37	101 174,20

Kritérium č.2	Hodnota kritéria
	v kalendárnych dňoch
lehota dodania predmetu zákazky	101

Miesto: Dunajská Streda

Dátum: 09.02.2016

Štatutárny orgán (konateľ)
BAVEČEK Štefan - GAGAKO - STAV
 Nám. Priateľstva 2169/19
 929 01 DUNAJSKÁ STREDA
 IČO: 32 322 127
 IČ DPH: SK1020254895

.....
 Pečiatka a podpis oprávnenej osoby
